GRUNDREPARATIONER I SKÄRGÅRDEN - SAARISTON PERUSKORJAUKSET 2023

15.11.2023

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salku-tus	Ika	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 46	Ennuste €	Toteutuma %	
A		JEn, SPi	**4041.8435**	Nauvon yläkoulu/vesikattokorjaus, putkiremontti ja tiivistyskorjauksia					
				suunnittelu	0 €	122 €	130 €	100 %	Granlund Turku Oy
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö/putkiremontti	32 000 €	11 370 €	11 500 €	100 %	Fix Turku Oy, Lammin ikkuna Oy, JF-Service F:ma, RTV-Yhtymä, Nagu Service, Mika Ruti, Paimion peltituote Oy, Pract, Wurth Oy,KoneRent Oy, K-Rauta Itäharju
				urakkatyö/tiivityskorjauksia	4 000 €	28 761 €	29 000 €	100 %	Fix Turku Oy, Lammin ikkuna Oy, JF-Service F:ma, RTV-Yhtymä, Nagu Service, Mika Ruti, Paimion peltituote Oy, Pract, Wurth Oy,KoneRent Oy, K-Rauta Itäharju
				Yhteensä	**36 000 €**	**40 253 €**	**40 630 €**	100 %	
A		JEn, SPi	**4040.8434**	Nauvon alakoulu/ tiivistyskorjauksia					
				suunnittelu	4 000 €	0 €	4 000 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				Yhteensä	**4 000 €**	**0 €**	**4 000 €**	0 %	
A		JJa, SPi	**4151.8438**	Korppoo terveysasema/ ikkunakorjaus ja julkisivukunnostus					
				suunnittelu	2 100 €	2 025 €	2 100 €	100 %	Rak.inststo Raimo Keskitalo
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	27 900 €	7 140 €	27 900 €	88 %	Fix Turku
				Yhteensä	**30 000 €**	**9 165 €**	**30 000 €**	88 %	
A		JJa, SPi	**4044.8455**	Korppoon koulukeskus/lukkojärjestelmän ja valaisimien vaihto Led-valaisimiin					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	20 000 €	2 274 €	20 000 €	50 %	Schneider, Skärgårdens El-lås Kb, Ahlsell Oy
				Yhteensä	**20 000 €**	**2 274 €**	**20 000 €**	50 %	
A		JJa, SPi	**4164.8436**	Sateenkaari Korppoo/ D-siiven potilashuoneen kunnostus, saunan korjaus sekä lastauslaiturin ja varaston valmiiksisaattaminen					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	30 000 €	0 €	25 000 €	0 %	
				Siirto 5000€ Malmin koulun korjaussunnittelu ja kuntokartoitus	-5 000 €				
				Yhteensä	**25 000 €**	**0 €**	**25 000 €**	0 %	
A		JJa, SPi	**4132.8437**	Houtskarin päiväkoti/ ilmalämpöpumppujen asennus					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	6 000 €	4 267 €	4 300 €	100 %	Houtskärs El Ab
				urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				Yhteensä	**6 000 €**	**4 267 €**	**4 300 €**	100 %	

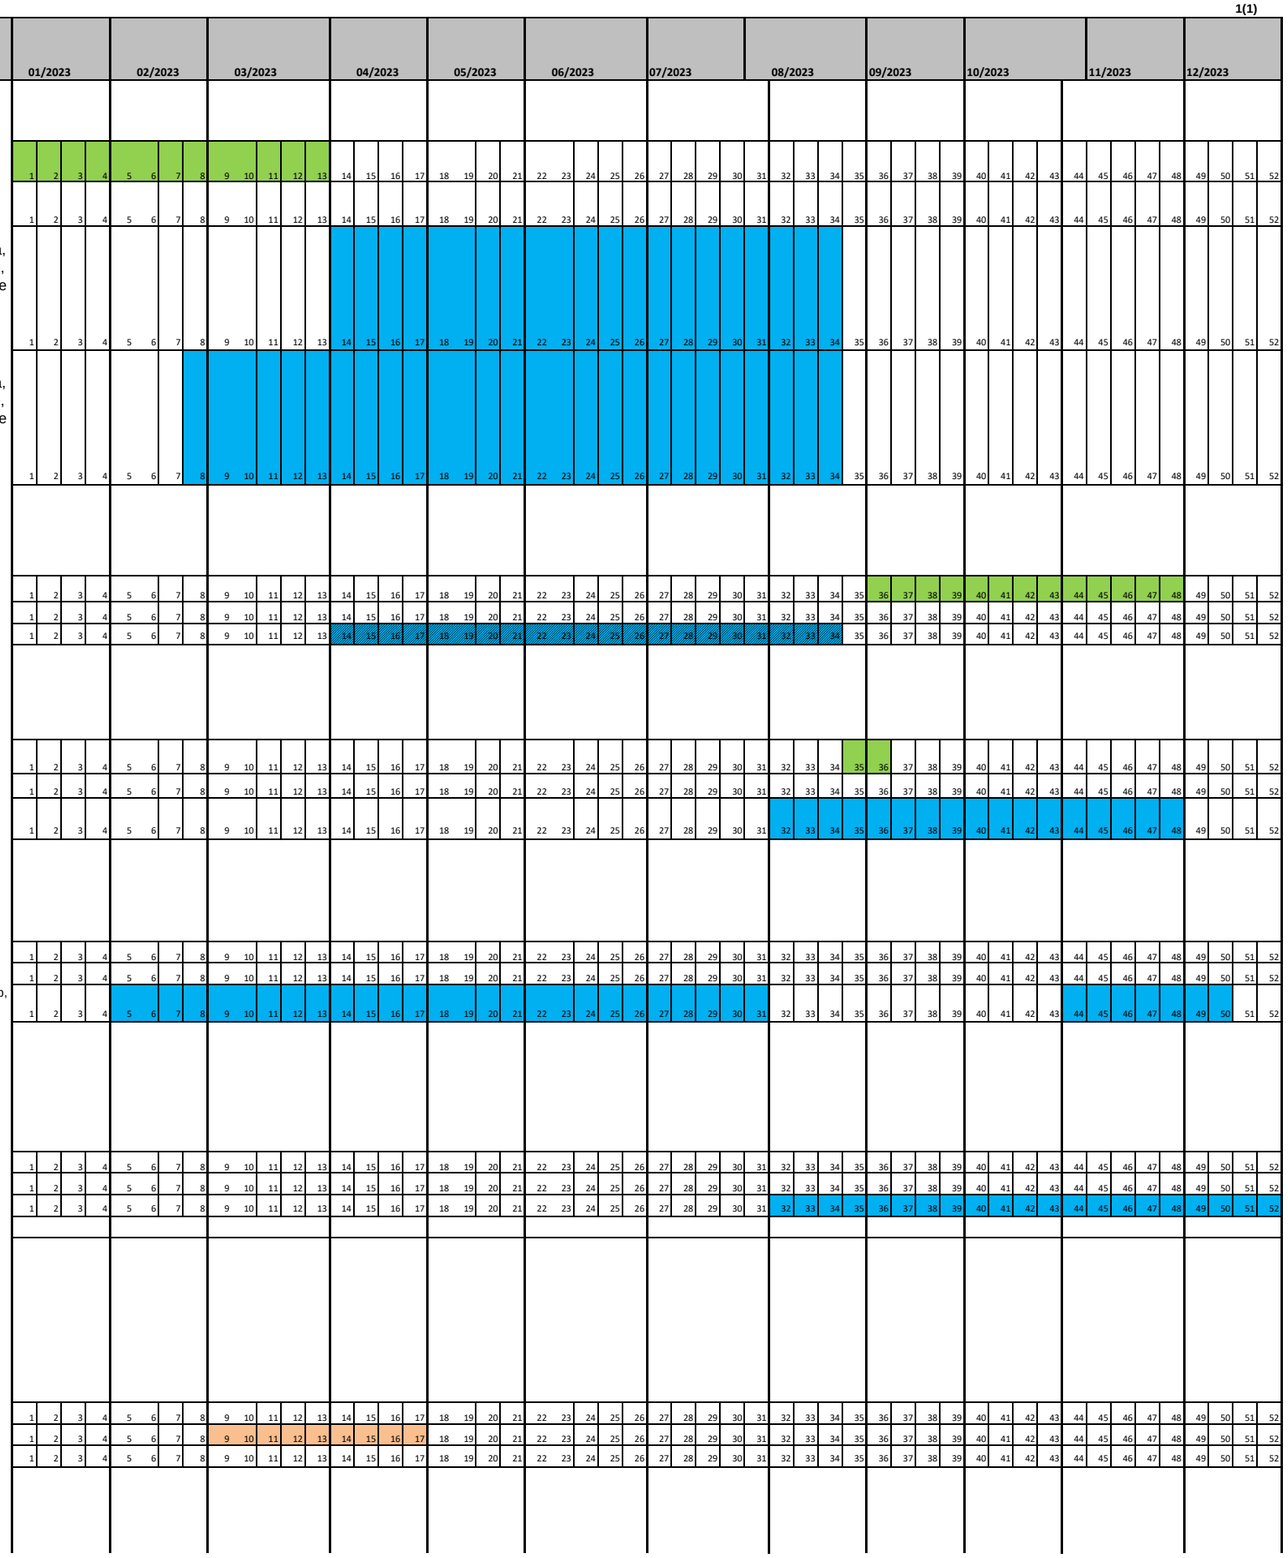

15.11.2023

Salku-tus	Ika	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 46	Ennuste €	Toteutuma %	
A		JJa, SPi	4166.8416	Fridhem/ Jäteaseman rakennekorjaus					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	8 000 €	0 €	8 000 €	0 %	
				urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				Yhteensä	**8 000 €**	**0 €**	**8 000 €**	0 %	
A		JJa,SPi	4296.8463	Houtskarin vierasvenesatama/ saunan ja pukutilojen korjaus+lukitusjärjestelmä					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	10 000 €	3 669 €	10 000 €	36 %	Tomas Mårtensson, M-Market Houtskär Ab
				Yhteensä	**10 000 €**	**3 669 €**	**10 000 €**	36 %	
A		JJa,SPi	4046.8450	Iniön koulu/Julkisivunmaalaus					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	7 000 €	0 €	4 000 €	0 %	
				Siirto 3000€ Malmin koulun korjaussunnittelu ja kuntokartoitus	-3 000 €				
				Yhteensä	**4 000 €**	**0 €**	**4 000 €**	0 %	
A		JJa,SPi	4102.8448	Iniö Snäckan/Julkisivunmaalaus					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	7 000 €	0 €	4 000 €	0 %	
				Siirto 3000€ Malmin koulun korjaussunnittelu ja kuntokartoitus	-3 000 €				
				Yhteensä	**4 000 €**	**0 €**	**4 000 €**	0 %	
A		JJa,SPi	4045.8458	Träsk skola/pihan asvaltointi					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	32 000 €	31 537 €	31 600 €	100 %	Peab Industri Oy, Tomas Mårtensson
				Yhteensä	**32 000 €**	**31 537 €**	**31 600 €**	100 %	
A		JJa,SPi	4229.8456	Korppoon aluekonttori/ maalämmön käytön tehostaminen					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
				urakkatyö	20 000 €	0 €	20 000 €	16 %	
				Yhteensä	**20 000 €**	**0 €**	**20 000 €**	16 %	
				Kaikki yhteensä	199 000 €	91 165 €	201 530 €	42 %	**kokonaistoteutuma**

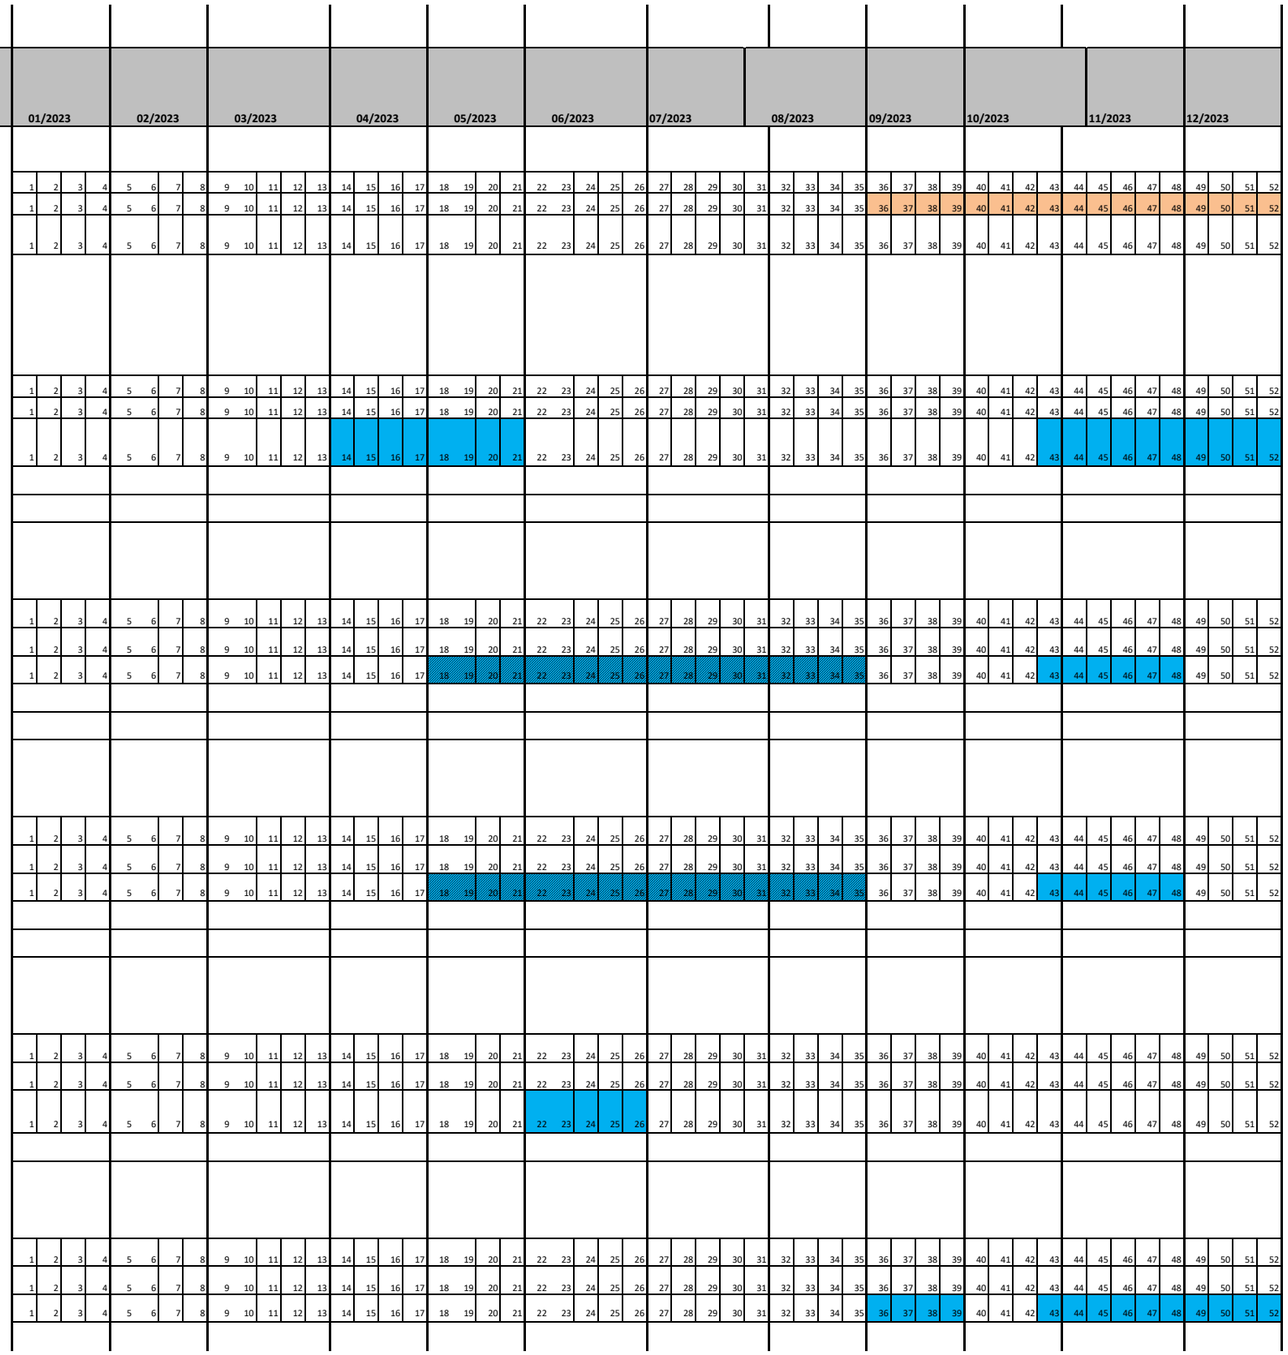

Salkut Ika	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset
